

理想

表单编号：JL-APQP-4-9/V2.0

全功能检验报告	重要度区分	■关键 □重要 □一般

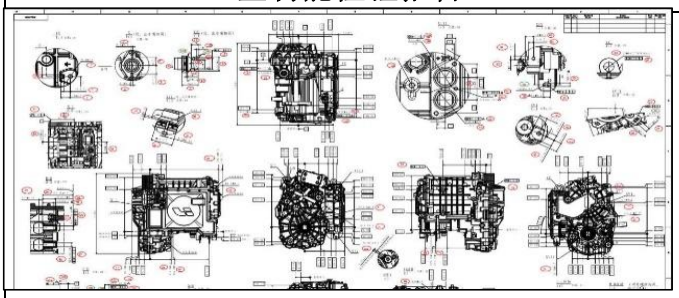

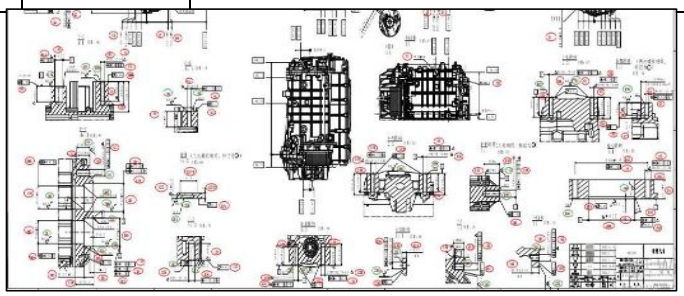

非尺寸

1	外观	壳体及结构零部件表面清洁（无明显油污，液体痕迹、泥沙等污物杂质）、无明显凹痕、锈蚀、磕碰伤、划伤、裂纹、起皮、变形；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2		光孔或螺纹孔无明显铸造缺陷，表面涂层不允许出现明显气泡、龟裂、脱落等缺陷；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3		总成外形应装配完整，无漏装；产品标识、标签及铭牌应清晰、完整且正确张贴；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4		紧固件、加放油螺塞等按规定的力矩拧紧或安装，无松动、漏装并有拧紧标记，螺栓镀层无脱落；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5		进出水口连接牢固，有进出水口标识、水管安装的对齐标识，有保护套；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6		接插件插针完好、无退针、漏插、无歪斜、有保护套；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7		密封面无明显溢胶；各结合面、通气塞及油封处不应有渗漏油，满足密封性检测的要求；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	铭牌	内容正确，字迹清晰无缺失、表面无深划伤、磕碰；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	钢印	内容正确，字迹清晰无缺失、表面无深划伤、磕碰，流水号不重号；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	永久钢印要求	1、生产批次号与标签零件序列号保持一致，命名规范参考Q/LIA1600003； 2、前后用星号☆（5瓣）； 3、电机型号：YS210XY103，字体为ARIAL，字高≥4mm，长宽比1，两行信息间隔3mm，星号与数字键无空格。 4、生产批次号：示例23210（23表示年，公历年份后2位，2表示月份，1-9月相对应， 10-12分别用A，B，C对应，10表示日期 5、零部件序列码:2321010001（前5位用生产批次号，第6位为产线序列号，第一条产线(EP2生产产线)序列号为1，后续新增产线的序列号按2、3、4……依次递增，后4位生产序列号，每日均从0001开始; 6、钢印字体深度0.2Min	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	二维码	标签内容正确，粘无漏贴、贴反、翘边现象，字迹清晰无缺失，二维码清晰无缺失	目视+PDA	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	接地标识	接地标识位置满足图纸要求	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13	高压警示标识	高压警示标识内容、位置和数量满足图纸要求，无漏贴、贴反、翘边现象，内容正确。直流母线安装位置有直流正负标识；	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14	高压警示标识要求	1、MCU和电机高压警示标识相同； 2、JEE现有警示标识如数模所示，黄底黑字	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
15	电驱动铭牌要求	1、此铭牌JEE常规采用白底黑字，防水PET； 2、理想LOGO、前电驱总成、零件号、出厂编号：大小7号，黑体； 3、其余字体大小6号，黑体； 4、分割线厚度0.25mm，与标签纸留出间隔2mm； 5、铭牌尺寸要求：75mm×40mm。	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK
16	总成追溯标签要求	1、含有理想LOGO；2、零部件编号：LAC-21000021； 3、供应商代码：9CN 4. 生产批次号：23210（23表示年，公历年份后2位;2表示月份，1-9月相对应，10-12分别用A，B，C对应；10表示日期 5、零部件序列码:2321010001（前5位用生产批次号，第6位为产线序列号，第一条产线(EP2生产产线）序列号为1，后续新增产线的序列号按2、3、4……依次递增，后4位生产序列号，每日均从0001开始） 6、数模版本号：由3位字码构成，由M00开始，依次为M01、M02……按照理想汽车PDM发布的数模版本号 7. 控制器类零部件软硬件版本：紧适用于控制器类零部件，单控制器硬件：HW，软件SW 。软硬件中间空格分开，版本规则见L.I./Q0110《控制器软件发布管理办法》，读取电控内部版本号 8、电机型号：YS210XY103； 9、控制器型号：KYS69XS26103； 10、二维码：二维码类型：QR-Code logo大小：25mm×25mm二维码信息体现明码内容，信息之间用“/”分隔，二维码信息示例：LAC-21000021/9CN/23210/2321010001/M04/HW0005/SW3004/YS210XY103/KYS69XS26103 11、以上标识字体采用Barlow Regular,各字码间不留空格，各部分内容相邻增加空格，字码高度不小于2.5mm。	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK

17	裸机重量	三合一总成重量＜84.5kg （5件一批）	台秤	84.47Kg	84.47Kg	84.49Kg	84.48Kg	84.48Kg	OK
18	残油油量（重量）	残油量控制在＜350mL	放油前后重量差，系统自动计算体积	328	334	334	334	334	OK
19	残液量	残液量≤50ml（确认水嘴位置无残液）	目视水嘴口无残液	OK	OK	OK	OK	OK	OK
20	动力端子对机壳冷态绝缘电阻	1000VDC测试5s（电机），1000VDC测试60s(电控)冷态绝缘电阻≥5MΩ@常温	电测仪	1967MΩ	407MΩ	798.2MΩ	2869MΩ	596.3MΩ	OK
21	动力端子对信号端子绝缘电阻	1000VDC测试5s（电机），1000VDC测试60s(电控)冷态绝缘电阻≥5MΩ	电测仪	1967MΩ	407MΩ	798.2MΩ	2869MΩ	596.3MΩ	OK
22	定子绕组对机壳	1000VDC测试5s（电机）,冷态绝缘电阻≥500MΩ	电测仪	7188.45MΩ	9586.9MΩ	9305.75MΩ	8962.63MΩ	7253.67MΩ	OK
23	定子绕组对温度传感器	1000VDC测试5s（电机），冷态绝缘电阻≥20MΩ	电测仪	＞10000MΩ	＞10000MΩ	＞10000MΩ	＞10000MΩ	＞10000MΩ	OK
24	动力端子对机壳耐电压	3600VDC测试10s(电控)，无击穿现象，且漏电流≤5mA	电测仪	0.0077mA	0.0078mA	0.0071mA	0.0084mA	0.0082mA	OK
25	动力端子对信号端子耐电压	3600VDC测试10s(电控)直流4000V，无击穿现象，且漏电流≤5mA	电测仪	0.0077mA	0.0078mA	0.0071mA	0.0084mA	0.0082mA	OK
26	绕组对机壳工频耐电压	2500VAC测试60s(电机)，无击穿现象，且漏电流＜20mA	电测仪	9.86mA	9.49mA	10.08mA	10.00mA	10.05mA	OK
27	绕组对温感工频耐电压	1500VAC测试5s(电机) 的耐电压试验，无击穿现象，漏电流≤5mA	电测仪	0.09mA	0.09mA	0.09mA	0.09mA	0.09mA	OK
28	温度传感器阻值检测	61.47kΩ±4.63kΩ	电测仪	60.81/60.72kΩ	59.74/59.26kΩ	62.81/61.10kΩ	60.84/60.09kΩ	61.48/61.82kΩ	OK
29	电机冷态直流电阻	测试3s 满足20℃条件下，线电阻在49.2mΩ±0.2mΩ	电测仪	49.21/49.06/49.14mΩ	49.32/49.25/49.34mΩ	49.21/49.33/49.21mΩ	49.13/49.34/49.22mΩ	49.34/49.12/49.22mΩ	OK
30	电机绕组匝间绝缘测试	试验电压峰值为4300V，波形面积差≤5%，波形差的面积≤10%	电测仪	OK	OK	OK	OK	OK	OK
31	PDIV检测	定子成品U对V、V对W、W对U，PDIV(Vp)≥3200V	电测仪	OK	OK	OK	OK	OK	OK
32	整机水道密封	250±10kPa，保压30s,测试10s,判定方法：压降≤5Pa/s；抽真空至2kPa，保持45s,最大允许泄露率2ml/min	气检仪	0.5Pa/s	1Pa/s	0.5Pa/s	0.9Pa/s	1.3Pa/s	OK
33	电机与减速箱腔体气密	25±2kPa，保压30s，测试10s,判定方法：压降≤5Pa/s	气检仪	0.5Pa/s	1Pa/s	0.5Pa/s	0.9Pa/s	1.3Pa/s	OK
34	控制器腔体气密	总成腔体、MCU腔体：25±2kPa，充气10s，保压30s，测试10s,判定方法：压降≤5Pa/s。	气检仪	0.5Pa/s	0.59Pa/s	0.59Pa/s	0.9Pa/s	0.59Pa/s	OK
35	上电检测	发送报文，检测下通讯情况，CAN 通讯功能正常，与油泵的通信正常	下线测试台架	OK	OK	OK	OK	OK	OK
36	MCU软件版本	通信读取软件版本号：SW4011	下线测试台架	SW4011	SW4011	SW4011	SW4011	SW4011	OK
37	硬件版本	通信读取硬件版本号：HW0006	下线测试台架	HW0006	HW0006	HW0006	HW0006	HW0006	OK
38	油泵软件版本	通信读取软件版本号	下线测试台架	Ox3005	Ox3005	Ox3005	Ox3005	Ox3005	OK
39	外特性检测（630V）	轮端转速450rpm时，轮端输出扭矩2426-2640Nm@3s，不过温	下线测试台架	2505.42	2494.07	2489.7	2488.2	2494.05	OK
40		轮端转速780rpm时，轮端输出扭矩1540-1675Nm@3s，不过温	下线测试台架	1656.59	1643.28	1632.6	1629.7	1616.97	OK
41	效率试验	在额定电压630V，电驱动总成的最高效率应不低于88%	下线测试台架	90.68	90.47	90.6	90.3	90.3	OK
42	NVH测试	在做峰值性能或者制定EOL下线测试工况时加速工况工况以及峰值转矩稳态工况即同时作为NVH的工况，具体下线指标待确认	下线测试台架	OK	OK	OK	OK	OK	OK
43	旋变出厂值	发1000rpm,记录实际出的转速1000±6rpm	下线测试台架	OK	OK	OK	OK	OK	OK
44	包装	使用专用吸塑托盘，外包装防护带包扎完好，无破损	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK

尺寸

1	EDS接地点安装尺寸	17(0.3,-0.3)	数显游标卡尺	16.81	16.80	16.78	16.83	16.79	OK
2		11.1(0,-0.6)	数显游标卡尺	10.95	10.91	11.02	10.94	10.97	OK
3		Φ28(0.6,-0.6)	数显游标卡尺	27.68	27.61	27.73	27.67	27.63	OK
3—1		8（0.5，0）	数显游标卡尺	8.25	8.21	8.19	8.24	8.21	OK
4	水嘴尺寸	3.7(0.1,-0.1)	数显游标卡尺	3.72	3.71	3.77	3.75	3.73	OK
5		17.2(0,-0.1)	数显游标卡尺	17.12	17.15	17.17	17.11	17.13	OK
6		16(0,-0.1)	数显游标卡尺	15.93	15.91	15.97	15.96	15.95	OK
7		2.7(0.1,-0.1)	数显游标卡尺	2.71	2.77	2.74	2.75	2.71	OK
8		Φ22(0,-0.3)	数显游标卡尺	21.83	21.92	21.87	21.76	21.92	OK
9		29(0.5,-0.5)	数显游标卡尺	29.21	29.34	29.27	29.31	29.35	OK
10		19(0.15,-0.15)	数显游标卡尺	19.10	19.02	19.09	19.05	19.07	OK
11		1.8(0.15,-0.15)	数显游标卡尺	1.84	1.82	1.81	1.88	1.92	OK
12		Φ16(0.2,-0.2)	数显游标卡尺	16.02	16.05	16.09	16.03	16.20	OK
13		Φ22.3(0,-0.3)	数显游标卡尺	22.11	22.16	22.19	22.14	22.23	OK
14	水嘴尺寸	Φ28.3(0.2,-0.2)	数显游标卡尺	28.32	28.37	28.41	28.33	28.41	OK

15	水嘴尺寸	位置度0.7	三坐标	0.3457	0.3638	0.3978	0.4081	0.3923	OK
16	水嘴尺寸	3（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	3.02	3.04	3.09	3.15	3.04	OK
17		12.5（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	12.44	12.42	12.39	12.41	12.43	OK
18	托举点尺寸	位置度0.3	三坐标	0.2216	0.1958	0.1988	0.2107	0.1918	OK
19		Φ14（0.2，0.1）	三坐标	14.1549	14.1634	14.1599	14.1589	14.1564	OK
20	机壳宽度	311.2（0.1，-0.1）	三坐标	311.2367	311.2461	311.2165	311.2315	311.2621	OK
21	托举点尺寸	Φ20（0.6，-0.6）	数显游标卡尺	20.33	20.41	20.35	20.37	20.46	OK
22		位置度0.8	三坐标	0.6357	0.6469	0.6182	0.5972	0.5861	OK
23	PTC安装点	Φ16.7（0.6，-0.6）	数显游标卡尺	16.79	16.72	16.75	16.74	16.77	OK
24	母线安装孔尺寸	同轴度0.05	三坐标	0.0162	0.0175	0.0236	0.0191	0.0221	OK
25		Φ31.6（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	31.66	31.61	31.68	31.62	31.68	OK
26		位置度0.3	三坐标	0.1230	0.0987	0.1321	0.0996	0.0987	OK
27		Φ4（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	4.07	3.91	4.01	3.94	3.99	OK
28		33（0.1，-0.1）	三坐标	33.0183	33.0289	32.9378	33.0726	32.9714	OK
29		同轴度0.05	三坐标	0.0041	0.0055	0.0052	0.0048	0.0059	OK
30		Φ31.6（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	31.68	31.54	31.51	31.68	31.53	OK
31	母线支架安装孔位置	7（0.5，0）	数显游标卡尺	7.24	7.37	7.26	7.37	7.29	OK
32		3（0.3，-0.3）	三坐标	3.1527	3.2152	3.1162	3.2316	3.2051	OK
33	低压线束固定孔	12（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	12.17	12.12	12.05	12.07	12.09	OK
34		位置度1	三坐标	0.8932	0.8631	0.8674	0.7897	0.8105	OK
35		7（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	7.14	7.18	7.01	7.09	7.04	OK
36	母线支架安装孔位置	8.9（0，-0.6）	三坐标	8.6240	8.5190	8.7135	8.4178	8.4111	OK
37		15（0.3，-0.3）	三坐标	15.2215	15.1411	15.2621	15.2282	15.1323	OK
38	吊装孔安装尺寸	3XΦ18（0.5，0）	数显游标卡尺	18.22/18.21/18.29	18.27/18.26/18.31	18.21/18.23/18.27	18.31/18.22/18.27	18.33/18.26/18.29	OK
39		位置度1	三坐标	0.2823	0.2961	0.2895	0.2931	0.3491	OK
40	低压线束固定孔	2X7（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	7.05/7.15	7.04/7.09	7.02/7.11	7.04/7.15	7.08/7.09	OK
41		2X12（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	12.07/12.03	12.09/12.16	12.10/12.08	12.08/12.09	12.13/12.07	OK
42		位置度1	三坐标	0.2656	0.3312	0.3412	0.2523	0.3523	OK
43	压缩机线束安装孔	12.5（0.55，-0.55）	数显游标卡尺	12.74	12.88	12.78	12.76	12.66	OK
44		16.5min	数显游标卡尺	16.89	16.99	16.89	16.89	16.99	OK
45		9.8(0.5,-0.5)	数显游标卡尺	9.87	9.91	9.84	9.93	9.87	OK
46		14.2(0.4,0)	数显游标卡尺	14.45	14.37	14.43	14.29	14.33	OK
47	水嘴尺寸	2.3(0.15,-0.15)	数显游标卡尺	2.39	2.34	2.39	2.41	2.38	OK
48		Φ28.5(0,-0.2)	数显游标卡尺	28.36	28.41	28.33	28.38	28.39	OK
49		3.7(0.1,-0.1)	数显游标卡尺	3.71	3.73	3.77	3.78	3.71	OK
50		2XR1.5	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
51	母线安装位置尺寸	平行度0.08	三坐标	0.0631	0.0561	0.0562	0.0621	0.0589	OK
52		2X0(0.3,-0.3)	三坐标	0.1984/0.1232	0.1936/0.0987	0.2312/0.1276	0.2013/0.1453	0.2162/0.1654	OK
53		33(0.3,-0.3)	三坐标	33.1131	33.1312	33.2971	33.1427	33.1331	OK
54		63.5(0.4,-0.4)	三坐标	63.6531	63.6271	63.6423	63.6167	63.6823	OK
55		2X7（0.35，-0.35）	三坐标	7.2511/7.1965	7.1363/7.2125	7.1136/7.1537	7.2231/7.2213	7.2098/7.1841	OK
56		M8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
57		位置度0.8	三坐标	0.2532	0.2635	0.3075	0.2768	0.3276	OK
58		M8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
59	母线安装位置尺寸	位置度0.8	三坐标	0.2456	0.3452	0.3312	0.3213	0.3313	OK
60		2X20min	数显游标卡尺	21.17/21.06	21.08/21.15	21.12/21.08	21.07/21.09	21.13/21.11	OK
61		2X22.5(0.3,-0.3)	数显游标卡尺	22.58/22.64	22.61/22.56	22.56/22.61	22.58/22.61	22.67/22.65	OK

62		163.33(0.5,-0.5)	三坐标	163.5632	163.5231	163.5835	163.5612	163.5612	OK
63	悬置端面尺寸	95.4(0.1,-0.1)	三坐标	95.3782	95.3867	95.3873	95.3712	95.3767	OK
64		62.86(0.2,-0.2)	三坐标	62.9362	62.8872	62.9117	62.9101	62.9231	OK
65		112.2(0.1,-0.1)	三坐标	112.2612	112.2135	112.2247	112.2531	112.2488	OK
66		122.2(0.2,-0.2)	三坐标	122.3234	122.3312	122.3221	122.3118	122.3222	OK
67		18.5(0.1,-0.1)	三坐标	18.5238	18.5291	18.5312	18.5190	18.5296	OK
68		365.2(0.2,-0.2)	三坐标	365.2692	365.259	365.2866	365.2971	365.2944	OK
69	低压线束固定孔尺寸	58.02(0.5,-0.5)	三坐标	58.2562	58.2636	58.2565	58.2151	58.2128	OK
70	PTC线束安装点尺寸	16.1(0.5,-0.5)	三坐标	16.3314	16.3214	16.3421	16.3231	16.3324	OK
71		Φ18.8(0.6,-0.6)	数显游标卡尺	19.14	19.03	19.03	19.18	19.12	OK
72	压缩机安装点位置尺寸	位置度0.3	三坐标	0.1895	0.1984	0.1783	0.1815	0.1922	OK
73	半轴支架位置尺寸	269.15（0.35，-0.35）	三坐标	269.2981	269.3011	269.2941	269.3192	269.3123	OK
74		267.17（0.35，-0.35）	三坐标	267.2617	267.2718	267.1982	267.2817	267.2710	OK
75	压缩机安装点位置尺寸	位置度0.3	三坐标	0.1871	0.1873	0.1768	0.1571	0.1683	OK
76	低压线束固定孔尺寸	12.6（0.2，-0.2）	三坐标	12.4617	12.4378	12.5201	12.5018	12.4989	OK
77	PTC线束安装点尺寸	148.37（0.15，-0.15）	三坐标	148.4618	148.4281	148.4271	148.4693	148.4285	OK
78		9.5（0.1，-0.1）	深度尺	9.5587	9.5383	9.5412	9.5128	9.5312	OK
79		2（0.1，-0.1）	三坐标	2.0571	2.0563	2.0361	2.0523	2.0312	OK
80	左悬置安装点尺寸	M12X1.75-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
81		位置度0.5	三坐标	0.2631	0.3152	0.2253	0.2316	0.2507	OK
82		2XM12X1.75-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
83		位置度0.3	三坐标	0.1512	0.1432	0.1651	0.1506	0.1511	OK
84		2X35min	数显游标卡尺	35.71	35.69	35.77	35.86	35.54	OK
85		35min	数显游标卡尺	35.78	35.79	35.89	35.75	35.65	OK
86	PTC线束安装孔尺寸	平面度0.1	三坐标	0.0134	0.0122	0.0098	0.0123	0.0111	OK
87		9（0.5，0）	三坐标	9.3123	9.3244	9.2897	9.2750	9.2897	OK
88		2XM8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
89		位置度0.8	三坐标	0.2341	0.2340	0.1989	0.2140	0.2231	OK
90		16min	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
91	支架安装孔	Φ22(0.6,-0.6)	数显游标卡尺	22.34	22.43	22.39	22.38	22.33	OK
92		Φ22(0.6,-0.6)	数显游标卡尺	22.39	22.34	22.29	22.28	22.35	OK
93	母线支架安装孔尺寸	15（0.3，-0.3）	数显游标卡尺	15.12	15.08	15.04	15.12	15.09	OK
94		平面度0.1	三坐标	0.0341	0.0234	0.0134	0.0244	0.0342	OK
95		位置度0.8	三坐标	0.3424	0.3363	0.4124	0.3923	0.4213	OK
96		M6X1-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
97	托举点尺寸	平面度0.03	三坐标	0.0098	0.0089	0.0101	0.0098	0.0078	OK
98	EDS接地点安装尺寸	25min	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
99		28min	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
100		平面度0.05	三坐标	0.0134	0.0098	0.0145	0.0145	0.0088	OK
101		M8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
102		位置度0.8	三坐标	0.3980	0.4531	0.4512	0.4234	0.3834	OK
103	托举点尺寸	Φ14（0.2，0.1）	数显游标卡尺	14.05	14.09	14.12	14.14	14.09	OK
104	托举点尺寸	位置度0.3	三坐标	0.1234	0.1832	0.1340	0.1231	0.1765	OK
105		同轴度0.05	数显游标卡尺	0.0253	0.0248	0.0236	0.0156	0.0340	OK
106		Φ22（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	22.04	22.05	22.03	22.05	22.04	OK
107		Φ22（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	22.06	22.01	22.01	22.01	21.99	OK
108		同轴度0.05	三坐标	0.0212	0.0234	0.0115	0.0234	0.0212	OK

109		2X12.5(0.1,-0.1)	三坐标	12.4783/12.4789	12.4801/12.4789	12.4822/12.4809	12.4812/12.4789	12.4897/12.4768	OK
110		2X23.5	三坐标	23.5432/23.5234	23.5923/23.4987	23.5603/23.5324	23.5676/23/5643	23.5478/23.5232	OK
111		5（0.1，-0.1）	深度尺	5.0456	5.0477	5.0680	5.0789	5.0654	OK
112		位置度0.2	三坐标	0.0139	0.0735	0.0230	0.0134	0.0234	OK
113		垂直度0.05	三坐标	0.0123	0.0109	0.0098	0.0089	0.0120	OK
114	母线安装孔尺寸	位置度0.4	三坐标	0.1244	0.1456	0.2123	0.1234	0.1563	OK
115		平面度0.08	三坐标	0.0098	0.0087	0.0067	0.0076	0.0034	OK
116		Φ27（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	27.04	26.99	26.97	27.05	27.01	OK
117		Φ27（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	27.03	27.05	26.99	27.07	27.04	OK
118		垂直度0.05	三坐标	0.0023	0.0033	0.0023	0.0018	0.0023	OK
119		位置度0.4	三坐标	0.1678	0.01423	0.1345	0.1450	0.1546	OK
120		2XM6X1-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
121		位置度0.4	三坐标	0.2134	0.1876	0.1234	0.1321	0.1897	OK
122		2X15min	数显游标卡尺	15.94/15.85	15.74/15.83	15.74/15.77	15.65/15.59	15.72/15.56	OK
123		3(0.3,-0.3)	数显游标卡尺	3.14	3.12	3.09	3.14	3.14	OK
123-1	低压线束安装点尺寸	21.6（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	21.63	21.64	21.66	21.65	21.64	OK
123-2		5（0.1，-0.1）	数显游标卡尺	5.04	5.04	5.05	5.05	5.06	OK
124		平面度0.1	三坐标	0.0099	0.0123	0.0098	0.0052	0.0071	OK
125	压缩机支架线束安装孔	M8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
126		位置度0.8	三坐标	0.4237	0.4567	0.5123	0.4456	0.4876	OK
127	压缩机支架线束安装孔	平面度0.05	三坐标	0.0341	0.0324	0.0312	0.0276	0.0280	OK
128		16min	数显游标卡尺	16.88	16.88	16.67	16.89	16.77	OK
129		35min	数显游标卡尺	35.56	35.78	35.78	35.71	35.69	OK
130		M12X1.75-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
131		位置度0.5	三坐标	0.2678	0.3123	0.2876	0.2123	0.3012	OK
132	后悬置安装孔尺寸	平面度0.03	三坐标	0.0134	0.0109	0.0123	0.0098	0.0145	OK
133		2XM12X1.75-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
134		位置度0.3	三坐标	0.2312	0.1789	0.1678	0.1987	0.1870	OK
135		2X35min	数显游标卡尺	35.44/35.67	35.78/35.77	35.56/35.87	35.74/35.67	35.58/35.78	OK
136		位置度0.8	三坐标	0.4542	0.4897	0.4123	0.4133	0.4984	OK
137	PTC线束安装孔尺寸	M8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
138		平面度0.1	三坐标	0.0088	0.0134	0.0145	0.0186	0.0982	OK
139		5.7（0.3，-0.3）	数显游标卡尺	5.86	5.79	5.82	5.83	5.79	OK
140		2X35min	数显游标卡尺	35.83/35.76	35.79/35.78	35.64/35.67	35.61/35.87	35.75/35.64	OK
141		位置度0.3	三坐标	0.2012	0.2090	0.1897	0.1897	0.2013	OK
142		2XM12X1.75-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
143	悬置安装点螺纹孔尺寸	平面度0.03	三坐标	0.0132	0.0099	0.0098	0.0077	0.0123	OK
144		位置度0.6	三坐标	0.4562	0.4133	0.4987	0.4435	0.4123	OK
145		M12X1.75-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
146	悬置安装点螺纹孔尺寸	35min	数显游标卡尺	35.78	35.79	35.65	35.58	35.89	OK
147		25min	数显游标卡尺	25.78	25.98	25.67	25.78	25.57	OK
148		3XM8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
149	压缩机安装点螺纹尺寸	位置度0.6	三坐标	0.3452	0.2987	0.3012	0.2978	0.3342	OK
150		平面度0.05	三坐标	0.0124	0.0125	0.0987	0.0123	0.0098	OK
151		16min	数显游标卡尺	16.89	16.89	16.89	16.68	16.77	OK
152		M8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
153		位置度0.8	三坐标	0.4432	0.4123	0.4772	0.3980	0.3461	OK

154	支架安装螺纹孔尺寸	平面度0.1	三坐标	0.0090	0.0121	0.0342	0.0165	0.0134	OK
155		11.9（0.55，-0.55）	数显游标卡尺	12.09	12.18	12.22	12.26	12.18	OK
156		M8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
157		位置度0.8	三坐标	0.4876	0.5647	0.6109	0.5123	0.5031	OK
158		平面度0.1	三坐标	0.0143	0.0132	0.0142	0.0178	0.0131	OK
159	半轴支架安装孔尺寸	平面度0.05	三坐标	0.0231	0.0199	0.0225	0.0145	0.0201	OK
160		Φ80（0.03，-0.01）	内径千分尺	80.014	80.019	80.017	80.021	80.015	OK
161		3（0.1，-0.1）	三坐标	3.0420	3.0245	3.0486	3.0377	3.0432	OK
162		同轴度0.4	三坐标	0.1342	0.1630	0.0987	0.1789	0.1678	OK
163		圆柱度0.02	三坐标	0.0144	0.0123	0.0101	0.0124	0.0177	OK
164		24.5（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	24.58	24.59	24.61	24.56	24.59	OK
165		位置度0.3	三坐标	0.1890	0.1456	0.1879	0.1567	0.1310	OK
166		2XM8X1.25-6H	通止规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
167		Φ126(0.15,-0.15)	三坐标	126.1123	126.1060	126.0980	126.0896	126.1023	OK
168		同轴度0.3	三坐标	0.1245	0.1563	0.0989	0.1208	0.1290	OK
169	油封压装深度	8.2（0.2,0）	数显深度尺	8.23	8.35	8.33	8.22	8.25	OK
170		8.2（0.2,0）	数显深度尺	8.25	8.24	8.31	8.22	8.32	OK
171	差壳支撑孔直径	2X30.985(0.084,0.055)	内径千分尺	31.055/31.058	31.064/31.062	31.058/31.061	31.057/31.064	31.056/31.062	OK
172	卡簧槽底径	2XΦ30.55（0.3，0）	内卡钳游标卡尺	30.66/30.66	30.65/30.69	30.66/30.66	30.68/30.69	30.65/30.64	OK
173	半轴支架限制面到减壳油封安装限位面距离	146.95（0.55，-0.55）	数显深度尺	147.26	147.22	147.24	147.22	147.21	OK
174	半轴支架限位面到差壳右端面距离	172.41（0.55，-0.7）	数显深度尺	172.59	172.66	172.69	172.71	172.77	OK
175	半轴防堵罩配合直径	2X58（0.2，-0.2）	数显游标卡尺	58.14/58.11	58.12/58.09	58.14/58.11	58.12/58.13	58.09/58.11	OK
176	半轴齿轮入口倒角宽度	2.5（0.2，-0.2）	轮廓仪	2.5462/2.5439	2.5528/2.5518	2.5462/2.5439	2.5573/2.5539	2.5478/2.5491	OK
177	卡簧槽倒角	2XR0.5Max	轮廓仪	0.271/0.284	0.275/0.292	0.282/0.263	0.294/0.288	0.293/0.284	OK
178	卡簧槽倒角粗糙度	Ra3.2	轮廓仪	0.98	0.73	1.12	0.77	0.98	OK
179	卡簧槽宽度	2X2.4（0.15，0）	轮廓仪	2.48/2.47	2.48/2.47	2.48/2.47	2.48/2.47	2.47/2.47	OK
180	半轴齿轮入口倒角粗糙度	Ra3.2	轮廓仪	1.24	1.33	1.45	1.26	1.11	OK
181	油封主唇到油封安装面距离	6.4（0，-0.9）	数显游标卡尺	6.21	6.28	6.19	6.22	6.23	OK
182	卡簧槽角度	60（3°，-3°）	轮廓仪	59.78	59.76	59.76	59.73	59.72	OK
183	水嘴位置倒角	R3	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
184		R2	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
185	母线安装孔位置倒角	2XR3.5	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
186	低压线束固定孔位置倒角	4XR3.5	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
187	托举点位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
188	EDS接地点位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
189	EDS接地点位置倒角	C1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
190	母线支架安装孔位置粗糙度	Ra6.3	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
191	母线支架安装孔位置倒角	C0.5	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
192	左悬置安装点位置倒角	3XC1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
193	左悬置安装点位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
194	PTC线束安装孔位置倒角	3XC1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
195	半轴支架安装孔位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
196	半轴支架安装孔位置倒角	2XC1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
197	压缩机安装点位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
198	压缩机安装点位置倒角	3XC1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
199	悬置安装点螺纹孔位置倒角	3XC1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
200	悬置安装点螺纹孔位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK

201	低压线束安装点位置粗糙度	Ra6.3	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
202	低压线束安装点位置倒角	C0.5	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
203	母线安装孔位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
204	母线安装孔位置倒角	2XC0.5	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
205	母线安装孔位置倒角	2XR0.5	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
206	母线安装孔位置粗糙度	Ra1.6	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
207	母线安装孔位置倒角	4XR0.5	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
208	母线安装孔位置粗糙度	Ra1.6	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
209	母线安装孔位置倒角	4XR0.2Max	R规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
210	母线安装孔位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
211	母线安装孔位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
212	压缩机支架线束安装孔位置倒角	C1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
213	压缩机支架线束安装孔位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
214	后悬置安装孔位置倒角	3XC1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
215	后悬置安装孔位置粗糙度	Ra3.2	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
216	PTC线束安装孔位置粗糙度	Ra6.3	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
217	PTC线束安装孔位置倒角	C1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
218	支架安装螺纹孔位置倒角	C1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
219	支架安装螺纹孔位置粗糙度	Ra6.3	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
220	支架安装螺纹孔位置倒角	C1	倒角规	OK	OK	OK	OK	OK	OK
221	支架安装螺纹孔位置粗糙度	Ra6.3	粗糙度比较样块	OK	OK	OK	OK	OK	OK
222	差壳端面到油封安装面距离	16.4（+0.5，-0.72）	数显深度尺	16.38	16.28	16.48	16.33	16.31	OK
223	差壳端面到油封安装面距离	17.26（+0.5，-0.72）	数显深度尺	17.34	17.26	17.40	17.34	17.12	OK

序号	检查项目	判定标准	供方检查方法/检验工具	检查数据（可增加列）	判定结果

备注				供应商	巨一动力
				责任人	陈大伟
				日 期	2025/4/26
车型	W02	零件名称	前电驱动总成	零件号	LAC-21000021

巨一动力 质量部

理想

表单编号：JL-APQP-4-09/V2.0

尺寸检验报告

重要度区分	□关键 □重要 □一般

产品检验简图（可附页）

1、重要度请基于检查基准书进行填写，如仍未确定请联系主管TPM

2、产品检验简图要求采用矢量图，且图片分辨率尽量高（用A4纸扩展打印

非尺寸

1	表面粗糙度						
2	XXX功能						
3							
4							

尺寸

6							
7							
8							
9							
序号	检查项目	质量标准	检查方法	检查数据（可增加列）			判定结果
备注				供应商			
				责任人			
				日　期			
车型		零件名称		零件号			

填写注意点如下：
1、左上角需要时该报告的标题，当前仅允许是“尺寸检验报告”这六个字
2、在标题的右侧有平级的内容为“重要度区分”，其是归属在“单元格”内的，内容为关键/重要/一般三个选项的三选一形式
3、产品检验简图部分是图纸内容，仅可在该区域增加图纸的图片内容（不可在数据区域中间增加图，可在文件末尾附图）
4、只有序号区域为数字的行才会被判定为有效数据行
5、序号唯一，不同区域的序号需要连续
6、表格结尾部分格式需尽可能一致，改动部分仅有供应商/责任人/日期/车型/零件名称/零件号所在单元格对应的右侧单元格内具体的数值
7、图纸或者表格主体单元格中的图形不可干扰表格原有的线条
8、不得更改表格的格式
9、单文档只含有一个零件号尺寸检验报告
10、印章不要遮盖关键字段(数据)区域，减少对表格结构的干扰

